

LIMPEZA PREVENTIVA BACIA DE ESGOTAMENTO CORREGO SOUZA



ANDERSON DE CARVALHO LIMA



ü **Melhoria no atendimento ao cliente**

ü **Modernização**

ü **Sustentabilidade**

ü **Tecnologia**




INFORMAÇÕES SOBRE SUB-BACIA DE ESGOTAMENTO SOUZA

- ü Ações preventivas para otimização da Bacia de Esgotamento**
- ü Alta incidência de desobstrução de redes e ramais de esgotos**
- ü Grande concentração de restaurantes e bares**
- ü Lançamentos irregulares**




MAPA BACIA SOUSA

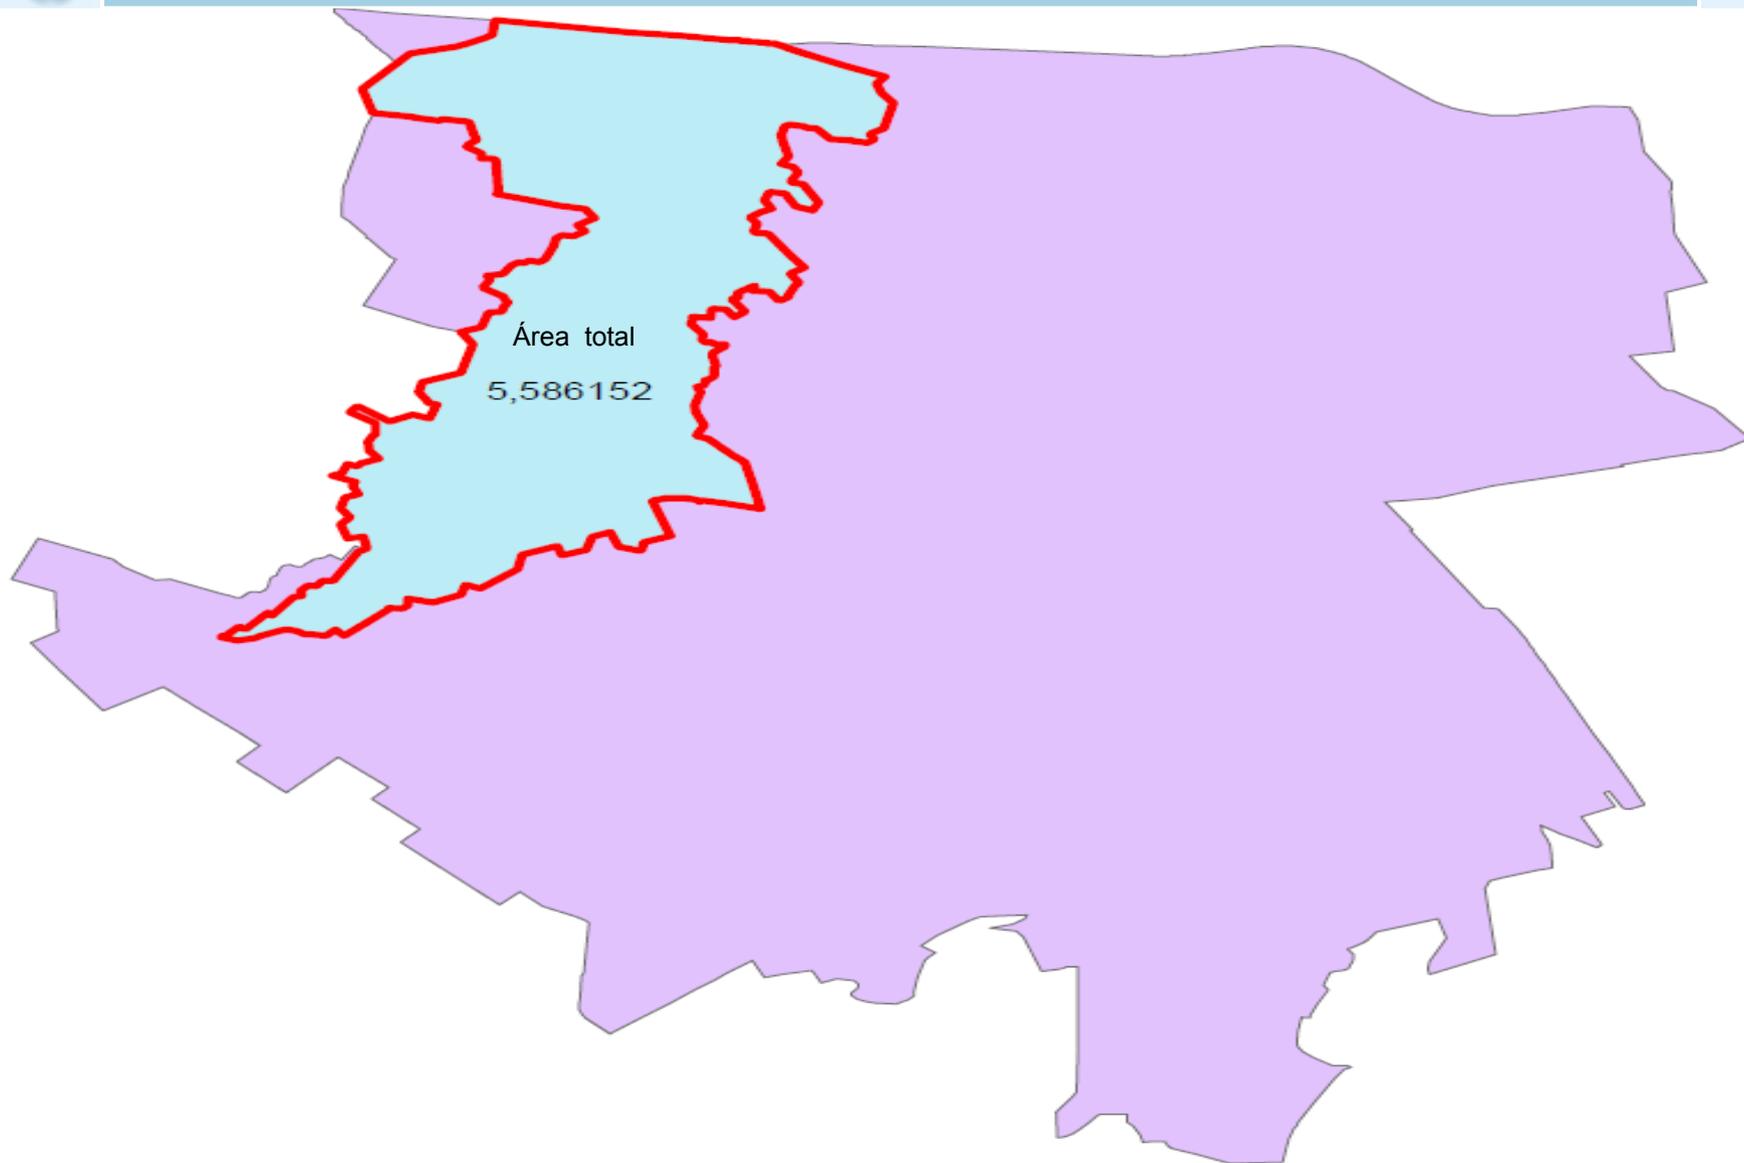

MAPA DA EXTENSÃO LIMPA DA BACIA



SUB-BACIA DE ESGOTAMENTO SOUZA (2,27KM)

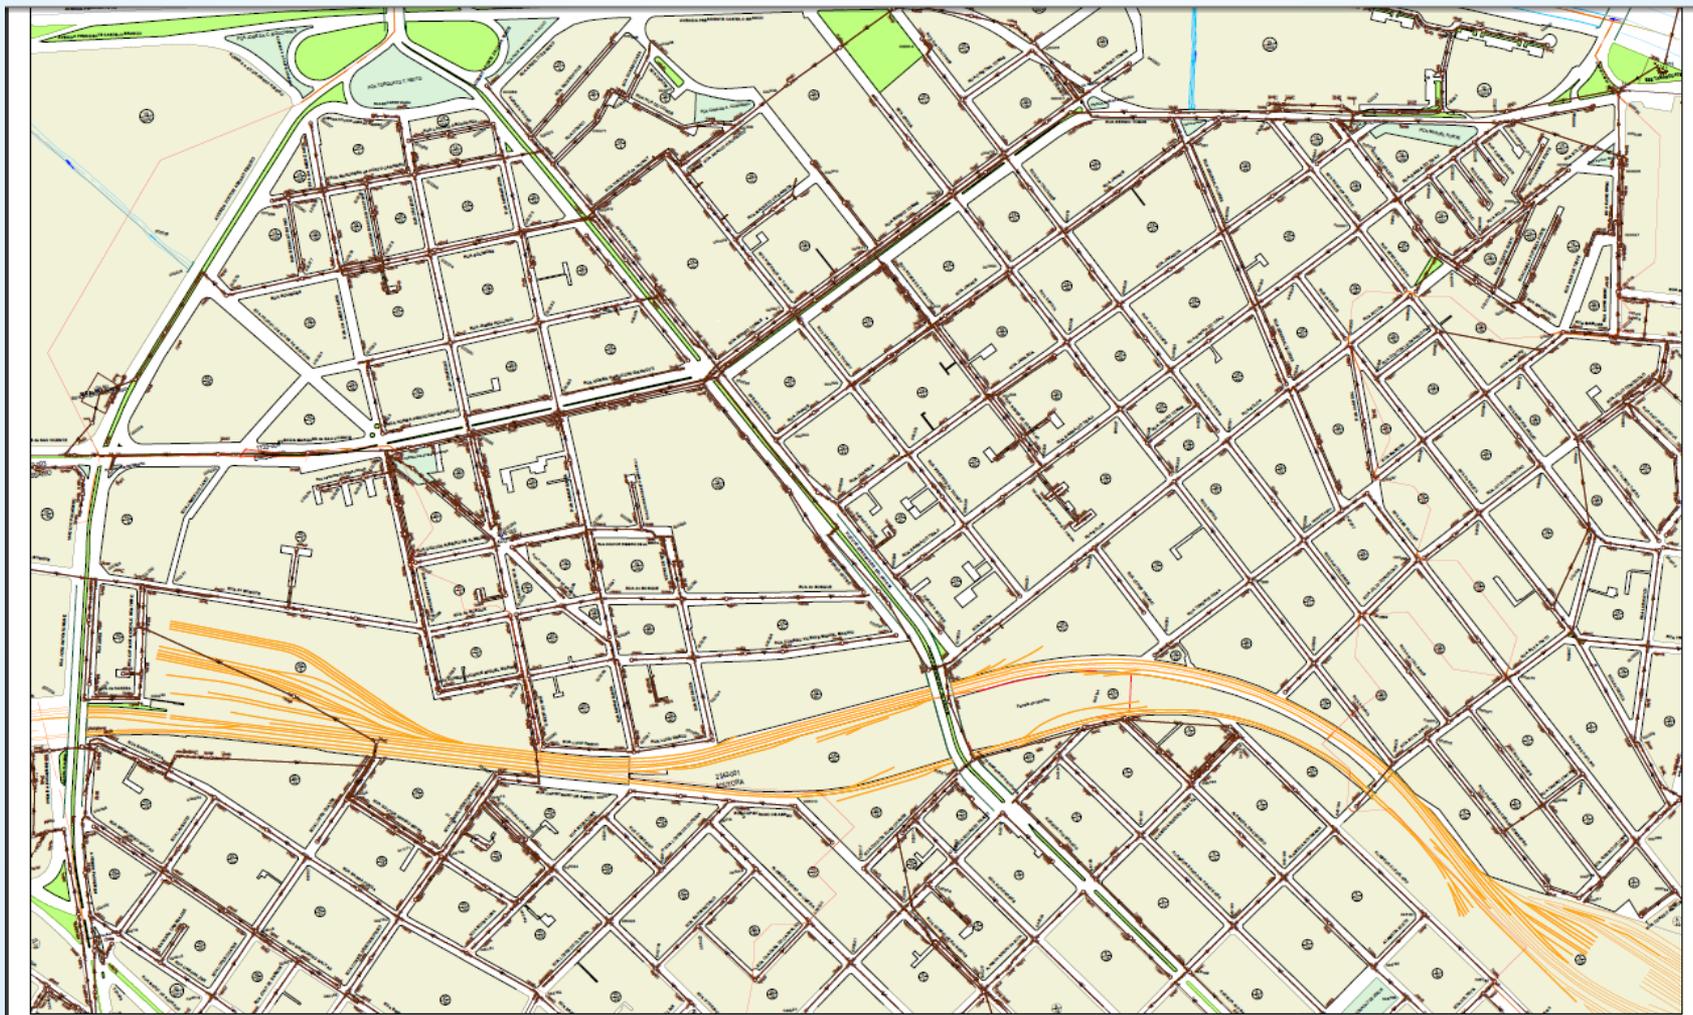

SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - SP



AÇÕES

- ü **Procedimento de execução:**
- ü **Poço de Visita abertos sempre no sentido Jusante x Montante;**
- ü **Execução de serviços de desobstrução e limpeza de redes de esgotos;**
- ü **Verificação dos lançamentos**
- ü **Cadastro de Redes**

EQUIPAMENTO RECICLADOR



CAMINHÃO COM HIDROJATO E ALTO-VACUO (SISTEMA DE RECICLAGEM)

CARACTERISTICAS

ü **Sistema automático de reciclagem de água**

ü **Compartimento para 10m^ε**

5m³ - Líquido

5m³ - Sólido

ü **Mangueira principal 160m**

ü **Mangueira secundaria 60m**

ü **Bomba de Sucção**



EQUIPAMENTO RECICLADOR




CARACTERÍSTICAS



**EQUIPAMENTOS
ACOPLADOS AO CAMINHÃO**



CARACTERISTICAS

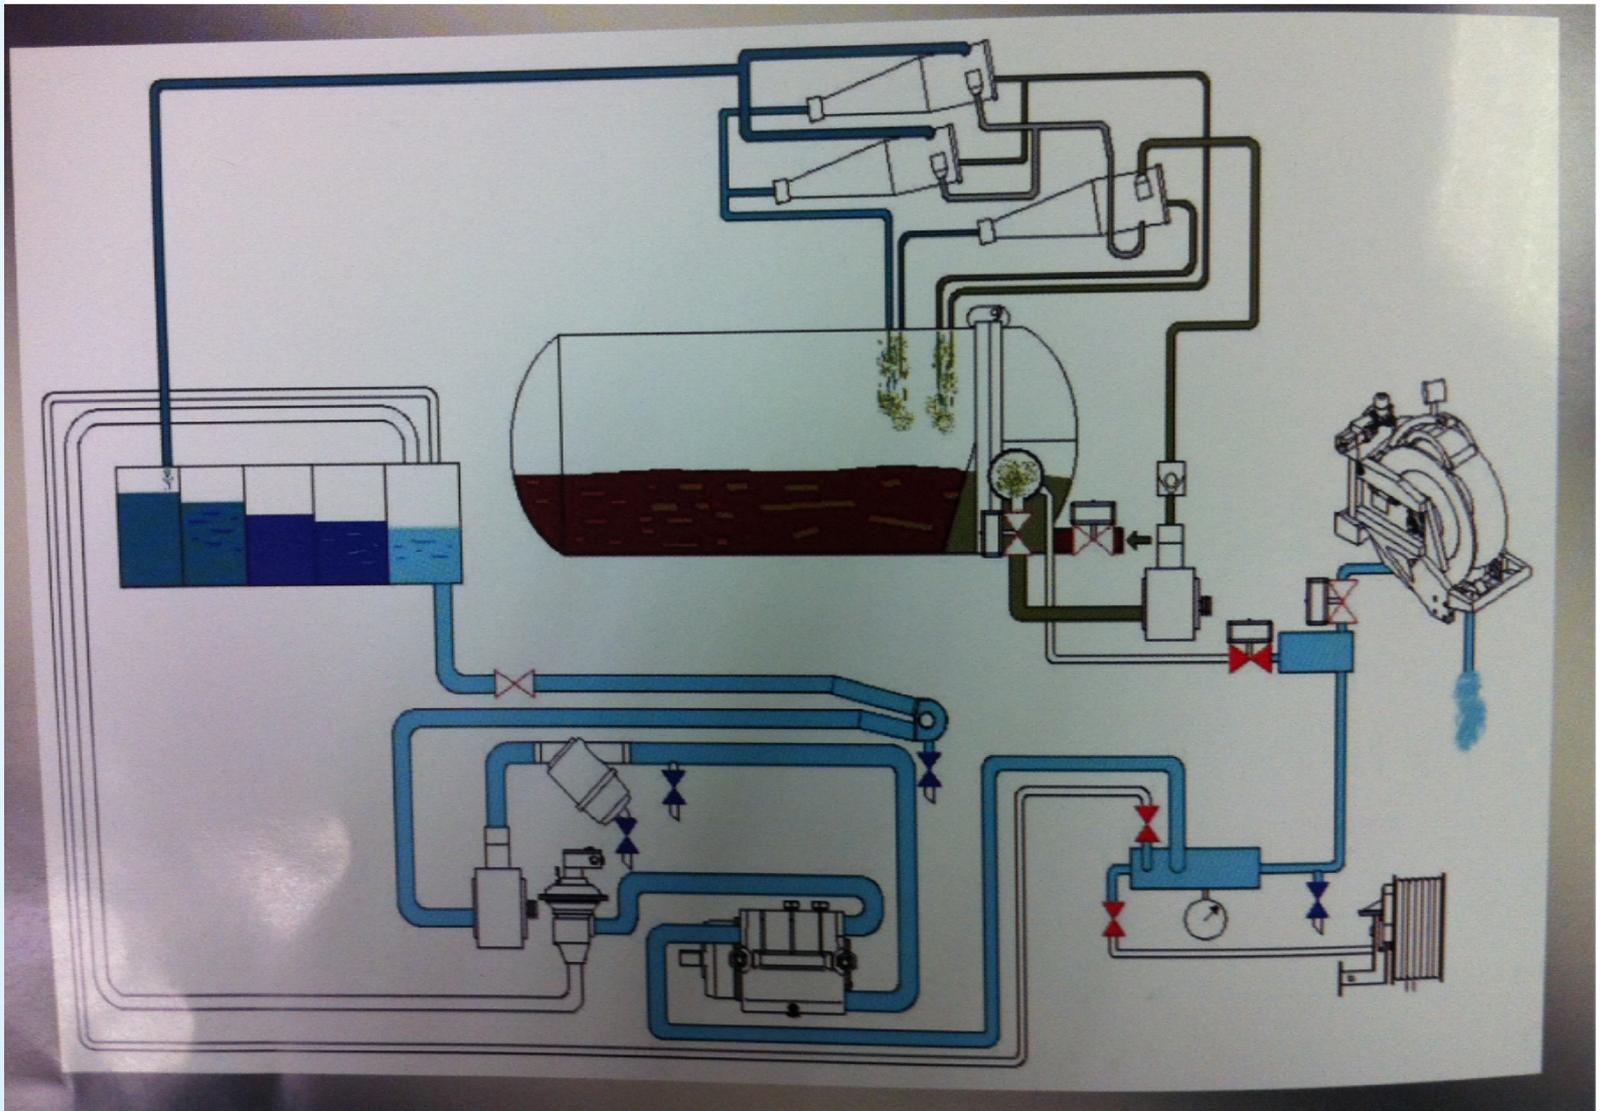

CT – RUA SOLIMÕES X RUA GERALDO BUONO



CT – RUA DOS SOLIMÕES X RUA PADRE LUIS ALVES DE SIQUEIRA



CT BARRA FUNDA AFOGADO – AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO





EXECUÇÃO DE LIMPEZA DO PV





RUA DOS SOLIMÕES X RUA GERALDO BUONO



ANTES



DEPOIS 

RUA PADRE LUIS ALVES DE SIQUEIRA

ANTES

DEPOIS



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO RUA VISCONDE DE TAUNAY





RUA VISCONDE DE TAUNAY



ANTES

DEPOIS



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO RUA CRUZEIRO X SOLIMÕES



RUA BARONESA DE PORTO CARREIRO



ANTES

DEPOIS






AVENIDA RUDGE



ANTES

DEPOIS

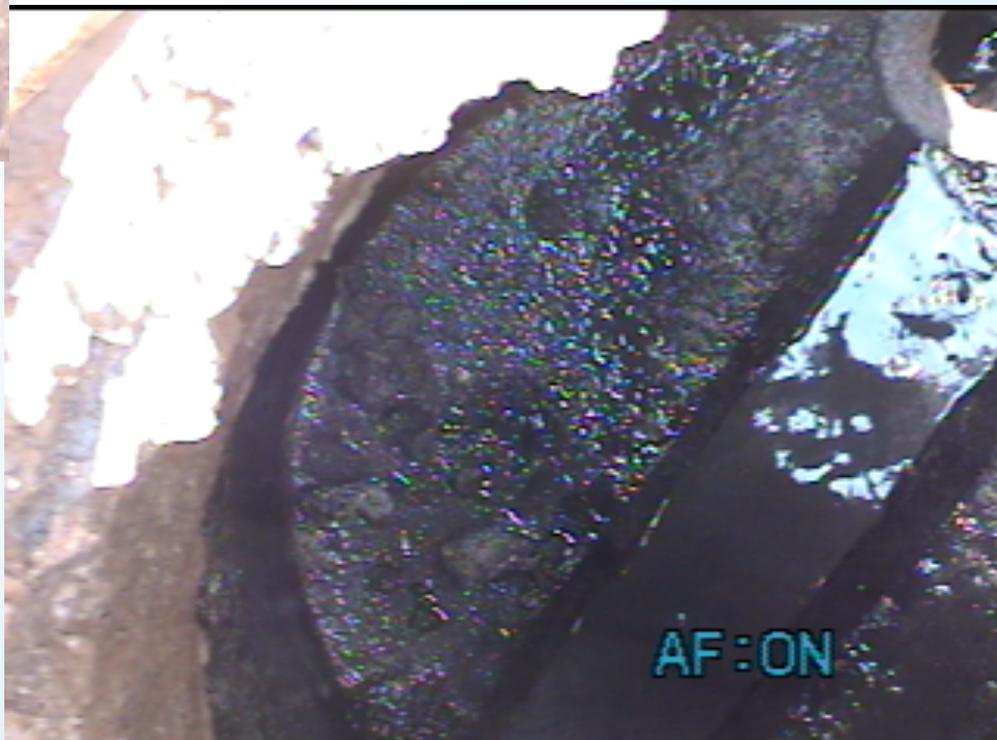




LEVANTAMENTO DAS AÇÕES PREVENTIVAS

ü **Conforme serviço executado obtivemos os seguinte diagnóstico:**

VERIFICAÇÕES	Nº DE OCORRÊNCIAS		
PV'S COM TAMPA DE GAP	02		
REDE SEM CADASTRO	02		
PV'S COBERTOS	10		
REDE AFOGADA	31		
REDE NORMAL	147		
CT AFOGADO	1		
CONSUMO DE ÁGUA	30 MIL / MÊS		
LANÇAMENTO IRREGULAR (GAP)	02		
TOTAL DE PV'S VISTORIADOS		178	
EXTENSÃO DE REDE LIMPA		10 KM	



ESTAÇÃO DE ESGOTO BARUERI





PARTICIPANTES

üJAIR

üCARLOS

üVANDERLI

üALLAN

üJOSÉ CARLOS

üMARCOS

üEQUIPES DE DC

üSELMA

Obrigado



Anderson de Carvalho Lima

Dados para contato: andersonlima@sabesp.com.br / 3388-6906

www.sabesp.com.br

 @ciasabesp

 SaneamentoSabesp

 www.facebook.com.br/oficialSabesp

 www.flickr.com/sabesp

